

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书


项目名称 漳平市银晟矿业有限公司银坑石灰石矿
建设单位 漳平市银晟矿业有限公司
建设地点 漳平市吾祠乡内林村
验收单位 龙岩九龙江环保科技有限公司

2024年7月17日

生产建设项目水土保持设施自验收鉴定书

生产建设单位		漳平市银晟矿业有限公司						
生产建设项目		漳平市银晟矿业有限公司银坑石灰石矿			联系人及电话		陈周南 13950824816	
水土保持方案编制	方案编制单位		龙岩九龙江环保科技有限公司					
	批准文号		漳水许可（2021）07号		批准机关		漳平市水利局	
	缴纳水土保持补偿费金额		0.613万元		缴纳日期		2021年5月24日	
	需要说明的其他情况		无					
水土保持监测	监测单位		自行监测					
	实际水土流失防治责任范围		0.613公顷		实际发生水土流失总量		71.95吨	
	土石方	开挖量	1.3655万立方米		外购量及来源		无	
		回填量	0.9558万立方米		弃方量及去向		0.4097万立方米，多余的废石用于当地民用建筑施工使用	
		弃方责任	本项目基建期产生的多余石方，外售给当地民用建筑施工使用。					
	实际完成防治目标	扰动土地整治率	95%	土壤流失控制比		1.0	林草植被恢复率	98%
		水土流失总治理率	98%	拦渣率		92%	林草覆盖率	27%基建期
需要说明的其他情况		建设期间无发生较大水土流失事件，建设后无存在水土流失危害						

水土保持设施验收	验收单位	龙岩九龙江环保科技有限公司		
	建设工期	2021年2月开工，2024年5月完工，建设总工期40个月。2024年5月投入生产		
	验收情况	<p>1. 本项目位于漳平市吾祠乡内林村。建设内容包括：硇采区、工业广场、生活区、矿山道路。</p> <p>2. 项目总征占地面积6130m²，其中硇口区占地面积385m²，工业场地区占地2816m²，办公生活区占地面积274m²；工程占地中永久占地面积385m²，临时占地面积3090m²，占地类型为林地、耕地。</p> <p>3. 工程建设中实际开挖1.3655万m³，回填0.9558万m³，余方0.4097万m³用于当地周边民用建筑施工使用。采矿工程区、工业广场、生活区、矿山道路区沉砂池、截排水沟、植物防护等措施到位，未产生较大水土流失量，不存在沉陷、垮塌或其它安全隐患。</p> <p>4. 建设单位严格实施水土保持方案确定的排水沉砂、临时遮盖、景观绿化和迹地恢复等防治措施。主要有：修建截排水沟670m，沉砂池1座，沉淀池1座，洗车平台1座，挡渣墙40m，景观绿化2000m²，种植罗汉松6株，塑料薄膜临时覆盖300m²。</p> <p>5. 方案确定水土保持总投资91.3899万元，实际完成投资90万元。依法应缴纳水土保持补偿费0.613万元，建设单位于2021年5月24日足额缴纳。</p> <p>6. 建设单位依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，基本完成了方案确定的各项防治任务；建成的水土保持设施达到了水土保持法律法规及技术规范、标准的要求，总体质量评定为合格，外观质量评定为合格，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。我单位依法开展了水土保持监测工作，建设期实际发生的水土流失总量远小于水土保持预测总量，各项水土流失防治措施指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失。</p> <p>7. 建设单位在项目运行期须进一步加强水土保持设施管护和安全监测，确保其正常运行和发挥效益。</p>		
验收结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 基本合格 <input type="checkbox"/> 不合格			
验收情况是否向社会公开	<input checked="" type="checkbox"/> 是	查询方式	福建环保网	
		问题和意见建议	无	
	<input type="checkbox"/> 否			

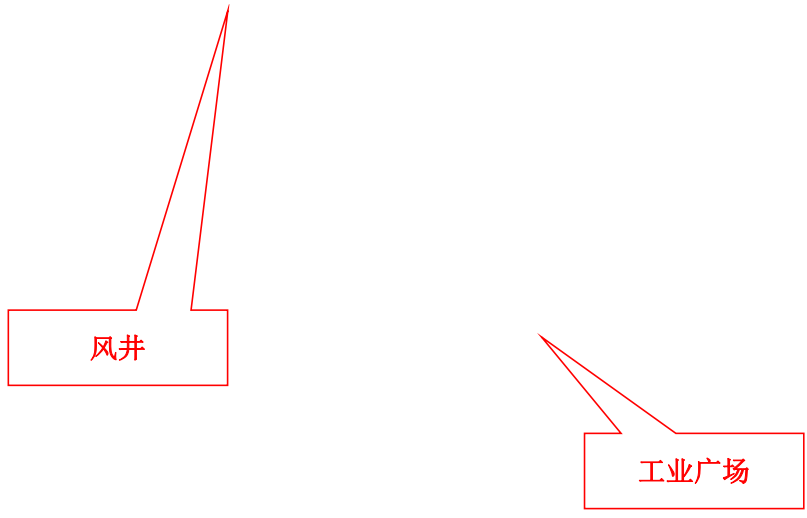

矿区总平面图

工业广场拦挡、临时覆盖图

主平硐

工业广场

风井口现状图

矿山道路

已封闭 PD3 硐口

工业广场洗车台

采硐涌水沉淀池

发电机房

主硐口截排水沟

工业广场

注：请使用电脑编辑打印或正楷字体填写本鉴定书，加盖单位公章后报送。备案内容将在漳平市政府网水利窗口上公告，申请单位需对材料的真实性、准确性和可靠性负责，若材料中存在虚假、伪造等违法违规情况，应承担一切法律责任。

